WORK PLAN (Rev-1.0) AND PROGRESS F0R THE VIEW HOTEL KUAKATA

Sl.	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
1	**THE VIEW HOTEL**	**500 d**	**18-09-20**	**19-02-22**	**92%**
1.1	**PRELIMINARIES**	**1 d**	**18-09-20**	**18-09-20**	**100%**
1.1.1	TAKE-OVER SITE FOR CONSTRUCTION	1 d	18-09-20	18-09-20	100%
1.2	**TOWER-1**	**218 d**	**19-09-20**	**24-04-21**	**92%**
1.2.1	**SUB-STRUCTURE**	**103 d**	**19-09-20**	**30-12-20**	**100%**
1.2.1.1	**PILE WORK-301 NOS**	**50 d**	**19-09-20**	**07-11-20**	**100%**
1.2.1.2	**PILE CAP-26 NOS**	**58 d**	**22-10-20**	**18-12-20**	**100%**
1.2.1.3	**SHORT COLUMN-31**	**47 d**	**07-11-20**	**23-12-20**	**100%**
1.2.1.4	**Lift Core-Below Grade Beam-2 nos**	**12 d**	**12-12-20**	**23-12-20**	**100%**
1.2.1.5	**GRADE BEAM**	**22 d**	**09-12-20**	**30-12-20**	**100%**
1.2.2	**SUPER STRUCTURE**	**122 d**	**24-12-20**	**24-04-21**	**82%**
1.2.2.1	**GROUND FLOOR**	**29 d**	**24-12-20**	**21-01-21**	**100%**
1.2.2.2	**1ST FLOOR**	**28 d**	**22-01-21**	**18-02-21**	**100%**
1.2.2.3	**2ND FLOOR**	**21 d**	**19-02-21**	**11-03-21**	**100%**
1.2.2.4	**3RD FLOOR**	**22 d**	**12-03-21**	**02-04-21**	**100%**
1.2.2.5	**4TH FLOOR**	**22 d**	**03-04-21**	**24-04-21**	**14%**
1.2.2.5.1	**Column-31 nos.**	**11 d**	**03-04-21**	**13-04-21**	**50%**
1.2.2.5.2	**Lift Core- 2 nos**	**11 d**	**03-04-21**	**13-04-21**	**0%**
1.2.2.5.3	**Stair**	**22 d**	**03-04-21**	**24-04-21**	**0%**
1.2.2.5.4	**Roof Slab-1672 m2**	**11 d**	**14-04-21**	**24-04-21**	**7%**
1.3	**TOWER-2**	**340 d**	**08-11-20**	**02-11-21**	**96%**
1.3.1	**SUBSTRUCTUFRE**	**118 d**	**08-11-20**	**05-03-21**	**100%**
1.3.1.1	**PILE WORK-156 NOS**	**35 d**	**08-11-20**	**12-12-20**	**100%**
1.3.1.2	**PILE CAP-17 NOS**	**48 d**	**21-12-20**	**06-02-21**	**100%**
1.3.1.3	**SHORT COLUMN-17**	**27 d**	**18-01-21**	**13-02-21**	**100%**
1.3.1.4	**Lift Core-Below Grade Beam-1 no.**	**12 d**	**02-02-21**	**13-02-21**	**100%**
1.3.1.5	**GRADE BEAM-192 m**	**31 d**	**03-02-21**	**05-03-21**	**100%**
1.3.2	**SUPERSTRUCTURE**	**192 d**	**05-04-21**	**02-11-21**	**86%**
1.3.2.1	**GROUND FLOOR**	**22 d**	**05-04-21**	**26-04-21**	**100%**
1.3.2.2	**1ST FLOOR**	**22 d**	**27-04-21**	**28-05-21**	**100%**
1.3.2.2.1	**Column-17 nos**	**11 d**	**27-04-21**	**07-05-21**	**100%**
1.3.2.2.2	**Lift Core-1 nos**	**7 d**	**01-05-21**	**07-05-21**	**100%**
1.3.2.2.3	**Stair-1 nos**	**18 d**	**01-05-21**	**28-05-21**	**100%**
1.3.2.2.4	**Roof Beam n Slab-929 m2**	**11 d**	**08-05-21**	**28-05-21**	**100%**
1.3.2.3	**2nd FLOOR**	**32 d**	**02-10-21**	**02-11-21**	**22%**
1.3.2.3.1	Column-17 nos	11 d	02-10-21	12-10-21	65%
1.3.2.3.2	Lift Core-1 nos	7 d	06-10-21	12-10-21	0%
1.3.2.3.3	Stair-1 nos	18 d	16-10-21	02-11-21	0%
1.3.2.3.4	Roof Beam n Slab-929 m2	11 d	23-10-21	02-11-21	30%
1.4	**PORTCH**	**35 d**	**06-02-21**	**12-03-21**	**100%**
1.4.1	**SHORT COLUMN**	**9 d**	**12-02-21**	**20-02-21**	**100%**
1.4.2	**GRADE BEAM**	**22 d**	**06-02-21**	**27-02-21**	**100%**
1.4.3	**Column**	**12 d**	**21-02-21**	**04-03-21**	**100%**
1.4.4	**Porch Beam n Slab-107 m2**	**8 d**	**05-03-21**	**12-03-21**	**100%**
1.5	**Restaurant Area**	**67 d**	**25-02-21**	**02-05-21**	**89%**
1.5.1	**Ground Floor Double Height**	**35 d**	**25-02-21**	**31-03-21**	**100%**
1.5.1.1	**Column-12 nos**	**11 d**	**28-02-21**	**10-03-21**	**100%**
1.5.1.2	Porch Slab-223 m2	14 d	25-02-21	10-03-21	100%
1.5.1.3	**Roof Beam n Slab-557 m2**	**29 d**	**03-03-21**	**31-03-21**	**100%**
1.5.2	**2nd Floor**	**32 d**	**01-04-21**	**02-05-21**	**76%**
1.5.2.1	**Column-12 nos**	**11 d**	**01-04-21**	**11-04-21**	**100%**
1.5.2.2	**Roof Beam n Slab-557 m2**	**29 d**	**04-04-21**	**02-05-21**	**67%**
1.6	**Between Tower-1 n Tower-2**	**63 d**	**09-03-21**	**10-05-21**	**100%**
1.6.1	Short Column	7 d	09-03-21	15-03-21	100%
1.6.2	Grade Beam	14 d	16-03-21	29-03-21	100%
1.6.3	Column	14 d	30-03-21	12-04-21	100%

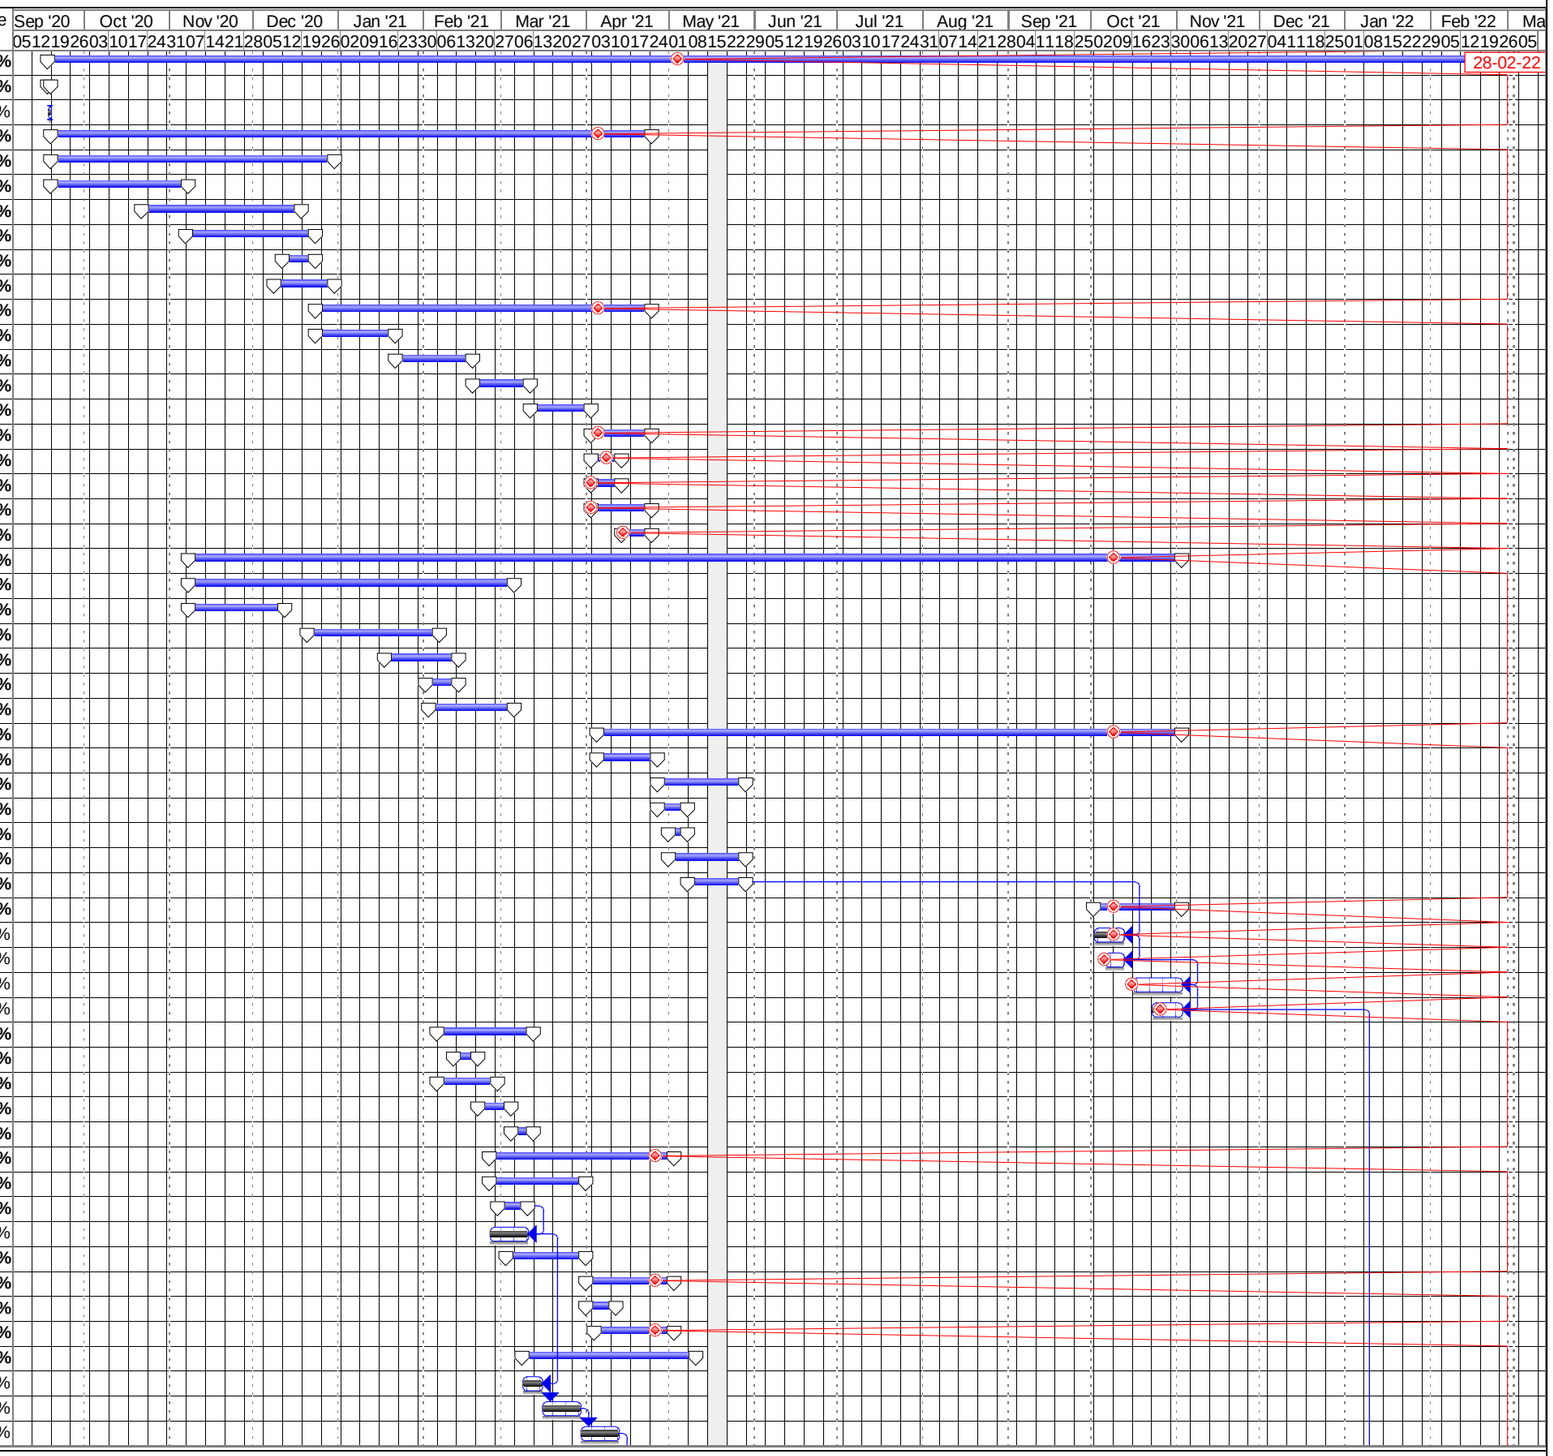

Date: 03-03-22 10.38
Sheet:1 /2

Task | Progress | Rolled Up Task | Rolled Up Progress | Group By Summary
Critical Task | Summary | Rolled Up Critical Task | Project Summary

WORK PLAN (Rev-1.0) AND PROGRESS F0R THE VIEW HOTEL KUAKATA

Sl.	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete
1.6.4	Goround Floor Roof Slab	14 d	13-04-21	26-04-21	100%
1.6.5	1st Floor Roof Slab-372 m2	14 d	27-04-21	10-05-21	100%
1.7	**Septic Tank-Soak Well**	**41 d**	**10-01-22**	**19-02-22**	**44%**
1.7.1	East Side-Soak Well-Slab	18 d	10-01-22	27-01-22	100%
1.7.2	West-Side Septic Tank	30 d	12-01-22	10-02-22	25%
1.7.3	*East Side Septic Tank*	*30 d*	*21-01-22*	*19-02-22*	*30%*



Date: 03-03-22 10.38
Sheet:2 /2

Task | Progress | Rolled Up Task | Rolled Up Progress | Group By Summary
Critical Task | Summary | Rolled Up Critical Task | Project Summary
